



COMITÉ DIRECTIVO  
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ACTA No. 07 (PRIMERA PARTE)

LUGAR : Montería, Acuavalle S.A E.S.P.  
FECHA : 6 de Octubre 2009  
HORA : 1:00 pm.

ASISTENTES EN MONTERIA:

Gobernadora de Córdoba	Dra. Marta Sáenz Correa
Representantes de los Alcaldes	Buenavista: Dr. Edwin Herazo Jiménez Cotorra: Dr. Martín Jalal Agámez
Secretario de Infraestructura Gobernación	Ing. José Inés Torres Contreras
Representante de la Corporación Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS -	Ing. Harry Bejarano Vega
Representante del Sena	Dra. Deyanira Guerra Villabón
Representante de Aguas de Córdoba	Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano
Representante de Acuavalle S.A E.S.P	Ing. Diego Padilla Zuluaga.
Coordinadora Gerencia ACUAVALLE	Ing. Ángela María Yepes Sierra

ASISTENTES EN BOGOTA:

Representante del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial	Dr. Juan Luis Mesa Echeverry
Representante del DNP	Dr. Edgardo Burgos Mejía
Representante MAVDT	Dr. Thonny Palencia Londoño

En las instalaciones de la Gerencia Integral de ACUAVALLE S.A E.S.P., ubicada Montería, en la calle 63 No. 6 - 58, siendo la 1:00 p.m. del día 6 de octubre de 2009, se reunieron los miembros del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua y Saneamiento de Córdoba, los primeros en Montería y los segundos en Bogotá, y a través de teleconferencia con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se estableció el siguiente Orden del día:



## COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



### ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUORUM.
2. INSTALACION.
3. LECTURA Y APROBACION ACTA DEL COMITÉ No. 6
4. INFORME DE AVANCE DEL PLAN.
  - 4.1 CONTRALORÍA
  - 4.2 AVANCE DEL PLAN
  - 4.3 AVANCE TECNICO
  - 4.4 TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL
  - 4.5 AVANCE PLAN DE INVERSIONES 2009
  - 4.6 AVANCE FINANCIERO
  - 4.7 AVANCE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN SOCIAL
5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El Delegado del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Dr. Thonny Palencia propone que la lectura del acta anterior se realice en el próximo Comité Directivo.

La propuesta es aprobada por el Comité en Pleno y se aprueba el siguiente orden del día

1. VERIFICACION DEL QUORUM.
2. INSTALACION.
3. INFORME DE AVANCE DEL PLAN.
  - 3.1 TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.


### DESARROLLO:

#### 1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Una vez leído el orden del día, se procede a constatar la asistencia de los miembros del Comité Directivo, se verifica que hay Quórum.

#### 2- INSTALACIÓN DEL COMITÉ:

La Dra. Marta Sáenz Correa da la bienvenida a los asistentes



# COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



### 3 -INFORME DE AVANCE DEL PLAN:

La Dra. Gloria Cabrales Gerente de Aguas de Córdoba presenta el avance de los procesos contractuales del Plan estratégico de inversiones 2009.

#### EJECUCIÓN POI 2009

##### NUMERO DE PROCESOS ADELANTADOS: 15

Con recursos de Regalías Indirectas:

##### - SOLICITUD PLURAL DE COTIZACION:

Interventorías:	2	\$	520.976.857,00
Obra Civil:	6		
Agua Potable:	5	\$	3.774.827.766,20
Saneamiento:	1	\$	1.144.841.958,00
<b>Total</b>		<b>\$</b>	<b>5.440.646.581,20</b>


Con recursos del Plan Departamental:

##### - SOLICITUD PLURAL DE COTIZACION: 5

Consultoria y/o Estudios:	1	\$	440.000.000,00
Agua Potable:	3	\$	3.254.919.875,38
Saneamiento Básico:	1	\$	3.648.350.745,19
<b>Total</b>		<b>\$</b>	<b>7.343.270.620,57</b>

##### - SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA: 2

Agua Potable:	1	\$	5.164.299.631,10
Saneamiento Básico:	1	\$	4.914.258.751,00
<b>Total</b>		<b>\$</b>	<b>10.078.558.382,10</b>



# COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA  
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  
AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. - GESTOR

RELACION DE PROYECTOS CONTRATADOS - RECURSOS REGALIAS INDIRECTAS

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

OBJETO	P. OFICIAL	PLAZO (MESES)	ESTADO	CONTRATO N°	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1 INTERVENTORIA TECNICA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUYO OBJETO SON: CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DEL ACUEDUCTO DE LOS GARZONES, EXTENSION DE REDES ARENAL Y CAÑO VIEJO PALOTAL, MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL EN EL	\$ 204.755.314,00	5	EN	ADC-INT-001-	ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ	\$ 204.740.000,00	
2 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	\$ 774.647.991,00	4	EJECUCION EN	2009 ADC-OC-001-	EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA	\$ 774.600.000,10	
3 CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DEL ACUEDUCTO DE LOS GARZONES - EXTENSION DE REDES ARENAL Y CAÑO VIEJO PALOTAL, MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	\$ 1.087.101.522,00	4	EJECUCION EN	2009 ADC-OC-002-	ALFONSO PACHECO OQUENDO	\$ 1.086.110.521,10	
4 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS VILLA ELIA Y JUAN B. CASADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	\$ 1.145.069.338,00	4,5	EJECUCION EN	2009 ADC-OC-003-	LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES	\$ 1.144.841.958,00	
5 INTERVENTORIA TECNICA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES LA DISMINUCION DE RIESGOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA	\$ 316.236.857,00	8	EN PROCESO DE				Inicio de ejecución programada para el 26 de Octubre de 2009
6 Construcción obras de disminución del riesgo del sistema de acueducto del Municipio de Moñitos, Departamento de Córdoba - SUMINISTRO EN INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ESTACION DE IMPULSION PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS	\$ 454.620.581,00	6	EVALUACION CONVOCADO				Inicio de ejecución programada para el 26 de Octubre de 2009
6 Construcción obras de disminución del riesgo del sistema de acueducto del Municipio de Moñitos, Departamento de Córdoba - CONSTRUCCION DE TANQUE, SISTEMA ELECTRICO Y ESTACION DE REBOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS	\$ 737.742.313,00	6	CONVOCADO				Inicio de ejecución programada para el 26 de Octubre de 2009
8 Construcción obras de disminución del riesgo del sistema de acueducto del Municipio de Moñitos, Departamento de Córdoba - CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS	\$ 721.754.351,00	4	CONVOCADO				Inicio de ejecución programada para el 26 de Octubre de 2009

## PROYECTOS PROPUESTOS PARA CUMPLIMIENTO DE INVERSION FORSOZA - FONDO PARA EL PLAN

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EROSION E INUNDACION DEL AREA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO:

\$ 485.732.720,00

MANTENIMIENTO Y EMPRADIZACION DE LAS ZONAS CONTIGUAS A LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS:

\$ 342.768.788,00



# COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA  
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  
AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P - GESTOR

PROYECTOS CONVOCADOS - SOLICITUD PLURAL DE COTIZACION


FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

OBJETO	P. OFICIAL	PLAZO (MESES)	ESTADO	CONTRATO N°	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1 CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	\$ 3.655.720.620,00	8	ADJUDICADO	ADC-OC-007-2009	LUIS BLADIMIR PEÑALOSA FUENTES	\$ 3.648.350.745,19	En proceso de legalización. Inicio de ejecución programado para la primera semana de Noviembre.
2 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE TIERRALTA - PRIMERA ETAPA	\$ 70.000.000,00	2	ADJUDICADO	ADC-OC-004-2009	INGENIERÍA CIVIL Y SANITARIA "INCMILSA LTDA"	\$ 69.986.000,00	En ejecución
3 PLAN DE CHOQUE PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE TUCHIN DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE MOMIL - (OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO, CONDUCCIONES Y ALMACENAMIENTO, MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA)	\$ 481.363.520,00	2	ADJUDICADO	ADC-OC-005-2009	LINO ANDRES MENDOZA  VELASQUEZ	\$ 471.736.249,00	En proceso de legalización. Inicio de ejecución programado para el 19 de Octubre de 2009
4 SECTORIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	\$ 2.715.408.680,00	6	ADJUDICADO	ADC-OC-006-2009	MARCO TULIO GONZALEZ  HERNANDEZ	\$ 2.713.197.626,38	En proceso de legalización. Inicio de ejecución programado para la primera semana de Noviembre.
5 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	\$ 440.000.000,00	6	CONVOCADO				En evaluación

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA  
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  
AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P - GESTOR

PROYECTOS CONVOCADOS - SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA

OBJETO	P. OFICIAL	PLAZO (MESES)	ESTADO	CONTRATO N°	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, ALIMENTANDO EN RUTA AL CEPILLO, EL CEDRO SAN ANTONIO, EL ZAPAL, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	\$ 5.165.025.719,00	6	ADJUDICADO	SPO-ADC-OC-001-  2009	CONSORCIO GENESAB AGUAS	\$ 5.164.299.631,10	En proceso de legalización. Inicio de ejecución programado para la primera semana de Noviembre.
2 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO PRIMERA ETAPA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	\$ 4.914.258.751,00	6	CONVOCADO				En evaluación



## COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



### AJUSTES PROYECTOS APROBADOS COMITÉ DIRECTIVO No. 4

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	NACION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
San Bernardo	Optimización del Sistema de Alcantarillado	5.164.915.432	2.387.471.219	2.452.528.780	324.915.433
Moñitos	Construcción sistema de Alcantarillado	7.896.110.040	4.396.110.040	3.500.000.000	0
Planeta Rica	Sectorización Municipio de Planeta Rica	2.853.910.815	1.412.827.136	987.903.480	453.180.199
Pueblo Nuevo	Optimización del Sistema de Alcantarillado del Municipio	3.369.794.345	1.901.536.590,00	1.008.204.128	460.053.627
Ciénaga de Oro	Construcción Sistema de Alcantarillado	3.842.184.311	1.921.092.156	1.921.092.156	0
Regional BajoSinú	Proyecto ERCAS contrato de operación con inversión	7.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	0
Montelíbano	Construcción de microacueducto rural corregimiento de Tierradentro	2.107.714.940	0	2.107.714.940	0
Cereté	Construcción de acueducto rural corregimiento Rabolargo, Ruta al Cepillo, el Cedro, San Antonio, el Zapal	5.428.473.022	5.374.725.764	53.747.258	0
<b>TOTAL</b>		<b>37.663.102.905</b>	<b>20.893.762.905</b>	<b>15.531.190.742</b>	<b>1.238.149.259</b>

**3.4 TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL:** La Gerencia del PDA a continuación presenta los avances de los procesos de transformación empresarial de los Municipios del Departamento que lo requieren de acuerdo con el cronograma establecido para llevar a cabo dichos procesos.

### Cronograma

FASES	DURACION (MESES)																				
	dic-08	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09	ago-09	sep-09	oct-09	nov-09	dic-09	ene-10	feb-10	mar-10	abr-10	may-10	jun-10	jul-10	ago-10
<b>Fase I</b>																					
Evaluación Gestión Empresarial																					
Evaluación Técnica Operativa																					
Análisis de las condiciones sociales																					
Análisis oferta y demanda																					
<b>Fase II</b>																					
Formulación POI																					
Capacidad de Pago																					
Identificación de Regionales																					
Selección Esquema Organizacional																					
Análisis de Costos y Tarifas																					
Esquema financiero																					
Análisis de Sensibilidad																					
<b>Fase III</b>																					
Información y socialización de los procesos																					
<b>Fase IV</b>																					
Constitución o Proceso de contratación																					
<b>Fase V</b>																					
Puesta en Marcha																					



## COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



**3.4.1 CAPACIDAD DE PAGO:** La Gerencia Asesora durante los meses de Febrero y Mayo adelantó encuestas en los diferentes Municipios del Departamento con el fin de determinar la Capacidad de pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los habitantes de los cascos urbanos.

Luego de tabuladas las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados:

Estrato y Uso	Pago promedio actual en AAyA	Compra de agua	Gasto real de AAyA	SMLMV
Estrato 1	27.494	30.539	58.033	0,117
Estrato 2	33.543	45.665	79.207	0.159
Estrato 3	42.297	50.400	92.697	0.187

Teniendo en cuenta el gasto en los tres servicios A.AyA y la compra de agua, el estrato 1 utiliza un 11% del SMLMV, el estrato 2 un 15% y estrato 3 un 18%.

Para el análisis o estructuración del esquema tarifario que se requiera para garantizar la prestación eficiente de los servicios de A.AyA, se puede establecer un rango en el que debería estar la factura por estos tres servicios, que tendrá como límite inferior lo que se paga actualmente y como superior el valor que incluye la compra de agua, rango en el cual se encuentra incluido el valor considerado en la disponibilidad a pagar si se mejorara el servicio.

**3.4.2 IDENTIFICACIÓN DE REGIONALES:** Dentro del proceso de transformación empresarial se identificaron los siguientes regionales:

### DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Regional	Municipio	Viviendas
Alto Sinú	TIERRALTA	6.947
	VALENCIA	2.823
<b>Total Alto Sinú</b>		<b>9.770</b>
Costanero Norte	MONITOS	1.447
	SAN BERNARDO DEL VIENTO	1.764
<b>Total Costanero Norte</b>		<b>3.211</b>
Costanero Sur	CANALETE	872
	LOS CORDOBAS	636
	PUERTO ESCONDIDO	868
<b>Total Costanero Sur</b>		<b>2.377</b>
San Jorge	AYAPEL	4.644
	BUENAVISTA	1.503
	LA APARTADA	1.974
	MONTELIBANO	10.855
	PUEBLO NUEVO	2.297
	PUERTO LIBERTADOR	2.994
<b>Total San Jorge</b>		<b>24.267</b>
Sinu-Sabanas	CHINU	4.523
	COTORRA	695
	SAN Pelayo	1.448
<b>Total Sinu-Sabanas</b>		<b>6.666</b>
<b>Total general</b>		<b>46.291</b>



## COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO




**3.4.3 COSTO DE OBRAS POR REGIONAL:** Considerando los diferentes POI por Municipíos, en la siguiente tabla se muestra el costo de las inversiones necesarias por regional.

REGIONAL	MUNICIPIO	POBLACION	COSTO DE OBRAS PARA ALCANZAR METAS	RECURSOS DISPONIBLES	DEFICIT
REGIONAL ALTO SINU	TIERRALTA	35.923	29.002	17.260	(11.742)
	VALENCIA	13.261	11.290	7.446	(3.844)
	TOTAL	49.184	40.292	24.706	(15.586)
REGIONAL SAN JORGE	PLANETA RICA	39.526	33.707	13.516	(20.191)
	LA APARTADA	10.792	8.309	7.747	(562)
	BUENAVISTA	7.231	11.275	7.351	(3.924)
	AYAPEL	22.269	29.176	16.431	(12.745)
	PUEBLO NUEVO	12.339	10.341	8.805	(1.536)
	MONTELIBANO	53.443	20.731	12.328	(8.403)
TOTAL	145.600	113.539	66.178	(47.361)	
REGIONAL COSTANERO SUR	CANALETE	3.615	6.320	6.894	574
	LOS CORDOBAS	3.662	11.819	8.076	(3.743)
	PUERTO ESCONDIDO	3.899	12.660	8.347	(4.313)
TOTAL	11.176	30.799	23.317	(7.482)	
REGIONAL COSTANERO NORTE	SAN BERNARDO DEL VIENTO	8.459	10.219	8.515	(1.704)
	MOÑITOS	5.788	18.665	9.819	(8.846)
	TOTAL	14.247	28.884	18.334	(10.550)

**3.4.4. SELECCIÓN DE ESQUEMA ORGANIZACIONAL:** A continuación se presenta los esquemas organizacionales propuestos para cada uno de los regionales en el área administrativa.

- Regional del Alto Sinú ( TIERRALTA, VALENCIA )

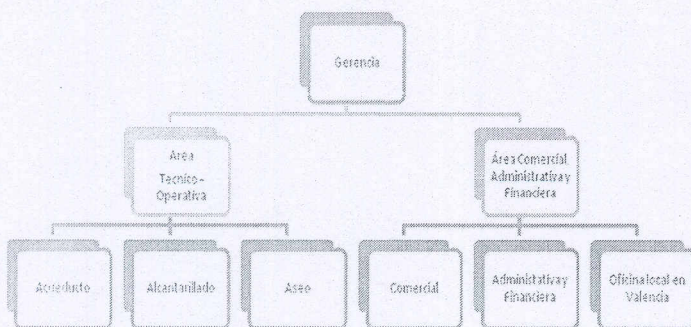

Área	Cargos	Número
Gerencia	Gerente	1
	Secretaria	1
	Jefe de Control Interno	1
Técnico Operativa	Coordinador AAA	1
Comercial, Administrativa y Financiera	Coordinador Comercial, Administrativo y Financiero	1
	Auxiliar Comercial	1
	Auxiliar administrativo y financiero	1
	Contador	1
	Jefe oficina local en Valencia	1
Total		9






# COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO




• **Regional del Sinú - Sabanas ( CHINU, COTORRA, SAN PELAYO )**

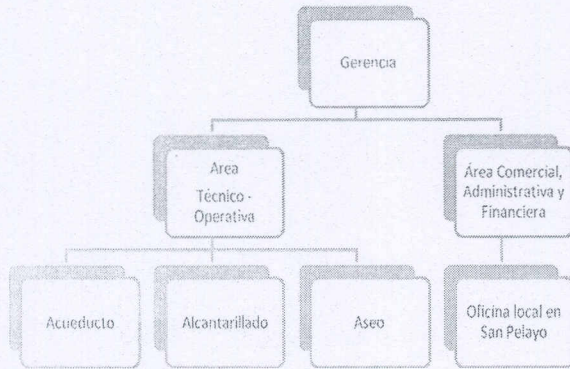

Área	Cargos	Número
Gerencia	Gerente	1
	Secretaría	1
	Jefe de Control Interno	1
Técnico Operativa	Coordinador AAA	1
Comercial, Administrativa y Financiera	Coordinador Comercial, Administrativo y Financiero	1
	Auxiliar Comercial, administrativo y financiero	1
	Contador	1
	Jefe oficina local en San Pelayo para San Pelayo y Cotorra	1
<b>Total</b>		<b>8</b>

• **Regional Costanero Norte (SAN BERNARDO DEL VIENTO, MOÑITOS ).**

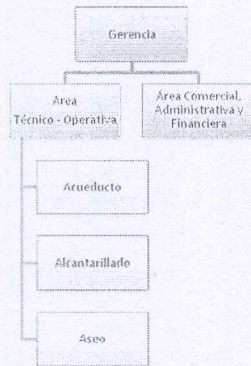


Área	Cargos	Número
Gerencia	Gerente	1
	Secretaría	1
Técnico Operativa	Coordinador AAA	1
Comercial, Administrativa y Financiera	Coordinador Comercial, Administrativo y Financiero	1
	Auxiliar Comercial, administrativo y financiero	1
	Contador	1
<b>Total</b>		<b>6</b>

• **Regional Costanero Sur (CANALETE, LOS CORDOBAS, PUERTO ESCONDIDO ).**




Área	Cargos	Número
Gerencia	Gerente	1
	Secretaría	1
Técnico Operativa	Coordinador AAA	1
Comercial, Administrativa y Financiera	Auxiliar Comercial, administrativo y financiero	1
	Contador	1
<b>Total</b>		<b>5</b>



# COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



- Regional San Jorge (AYAPEL, BUENAVISTA, LA APARTADA, MONTELIBANO, PUEBLO NUEVO, PUERTO LIBERTADOR ).

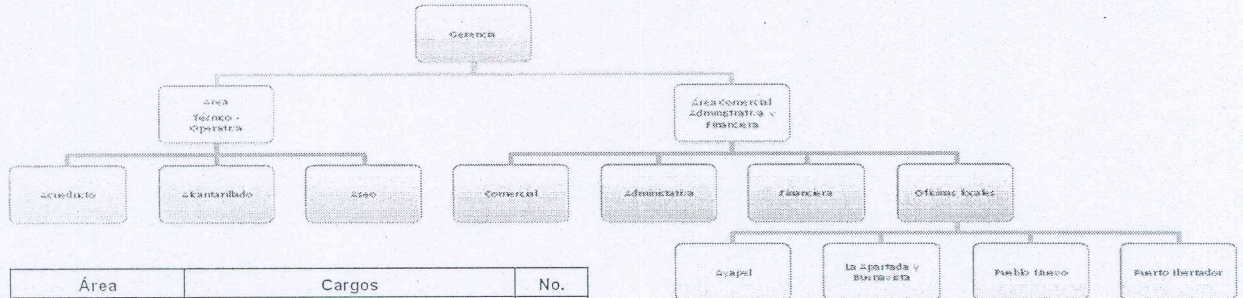



Área	Cargos	No.
Gerencia	Gerente	1
	Secretaría	1
	Jefe de Control Interno	1
Técnico Operativa	Coordinador AAA	1
	Auxiliar Acueducto	1
	Auxiliar Alcantarillado	1
Comercial, Administrativa y Financiera	Auxiliar Aseo	1
	Coordinador Comercial, Administrativo y Financiero	1
	Auxiliar Comercial	1
	Auxiliar administrativo	1
	Auxiliar financiero	1
	Contador	1
	Jefe oficina local en Ayapel	1
	Jefe oficina local en Apartada y Buenavista	1
Jefe oficina local en Pueblo Nuevo	1	
Jefe oficina local en Puerto Libertador	1	
Total		16

#### 4. PROPOSICIONES Y VARIOS

En este punto debido al cumplimiento de los Hitos para la medición de los compromisos periódicos de Avance del PDA establecidos en la cláusula Decima del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos firmado entre el Departamento de Córdoba y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Comité Directivo da viabilidad para que se desembolsen los recursos de la Nación y Audiencias Públicas por valor de \$ 20.000.000.000.

Autorizar los pagos programados en el Plan de Desembolso.

  
**MARTA SAENZ CORREA**  
 Presidenta

  
**DIEGO PADILLA ZULUAGA**  
 Secretario
